


# MÄLARPROJEKTET

## DETTA HÄNDER VECKA 062018

1. På Slussholmen pågår vibrering av spont, eventuellt också hammarslagning för stödkonstruktion till byggropen.
2. Vid nordöstra delen av slussen pågår montering av stödkonstruktion för den blivande mottagningsgropen för nya slusskonstruktionen.
3. På Lotsudden pågår borring för förankringsstag för den betongplatta som ska gutas i botten av den stora gropen när den har blivit urschaktad. Dessa borrhingsarbeten pågår även lördag och söndag mellan 09,00-19,00. Även borrhingsarbeten i linje för stödkonstruktion samt vibrering av spont och rör, eventuellt också hammarslagning av dito.
4. På sydöstra sidan om slussbron pågår arbeten för byggandet av en stödkonstruktion mot Grödingevägen.
5. Stagborring och smidesarbeten pågår på västra sidan norr och söder om Saltsjöbron.
6. Spontningsarbeten pågår vid Kanalholmen och upp mot Mälarbron på västra sidan av kanalen.
7. Utanför Sjöfartsverkets "prickförråd" utmed Bergviksgatan pågår etablering för kommande arbeten med krönbalksarbeten i kanalen.
8. Diverse mindre arbeten pågår utanför Hebbevillan och mittemot tvärs över kanalen med färdigställande av Skanovas nya ledning.
9. Styrhytten har på uppdrag av Telge Nät påbörjat arbeten nere vid Piren på östra sidan för omläggning av Telge Näts spillvattenledning.

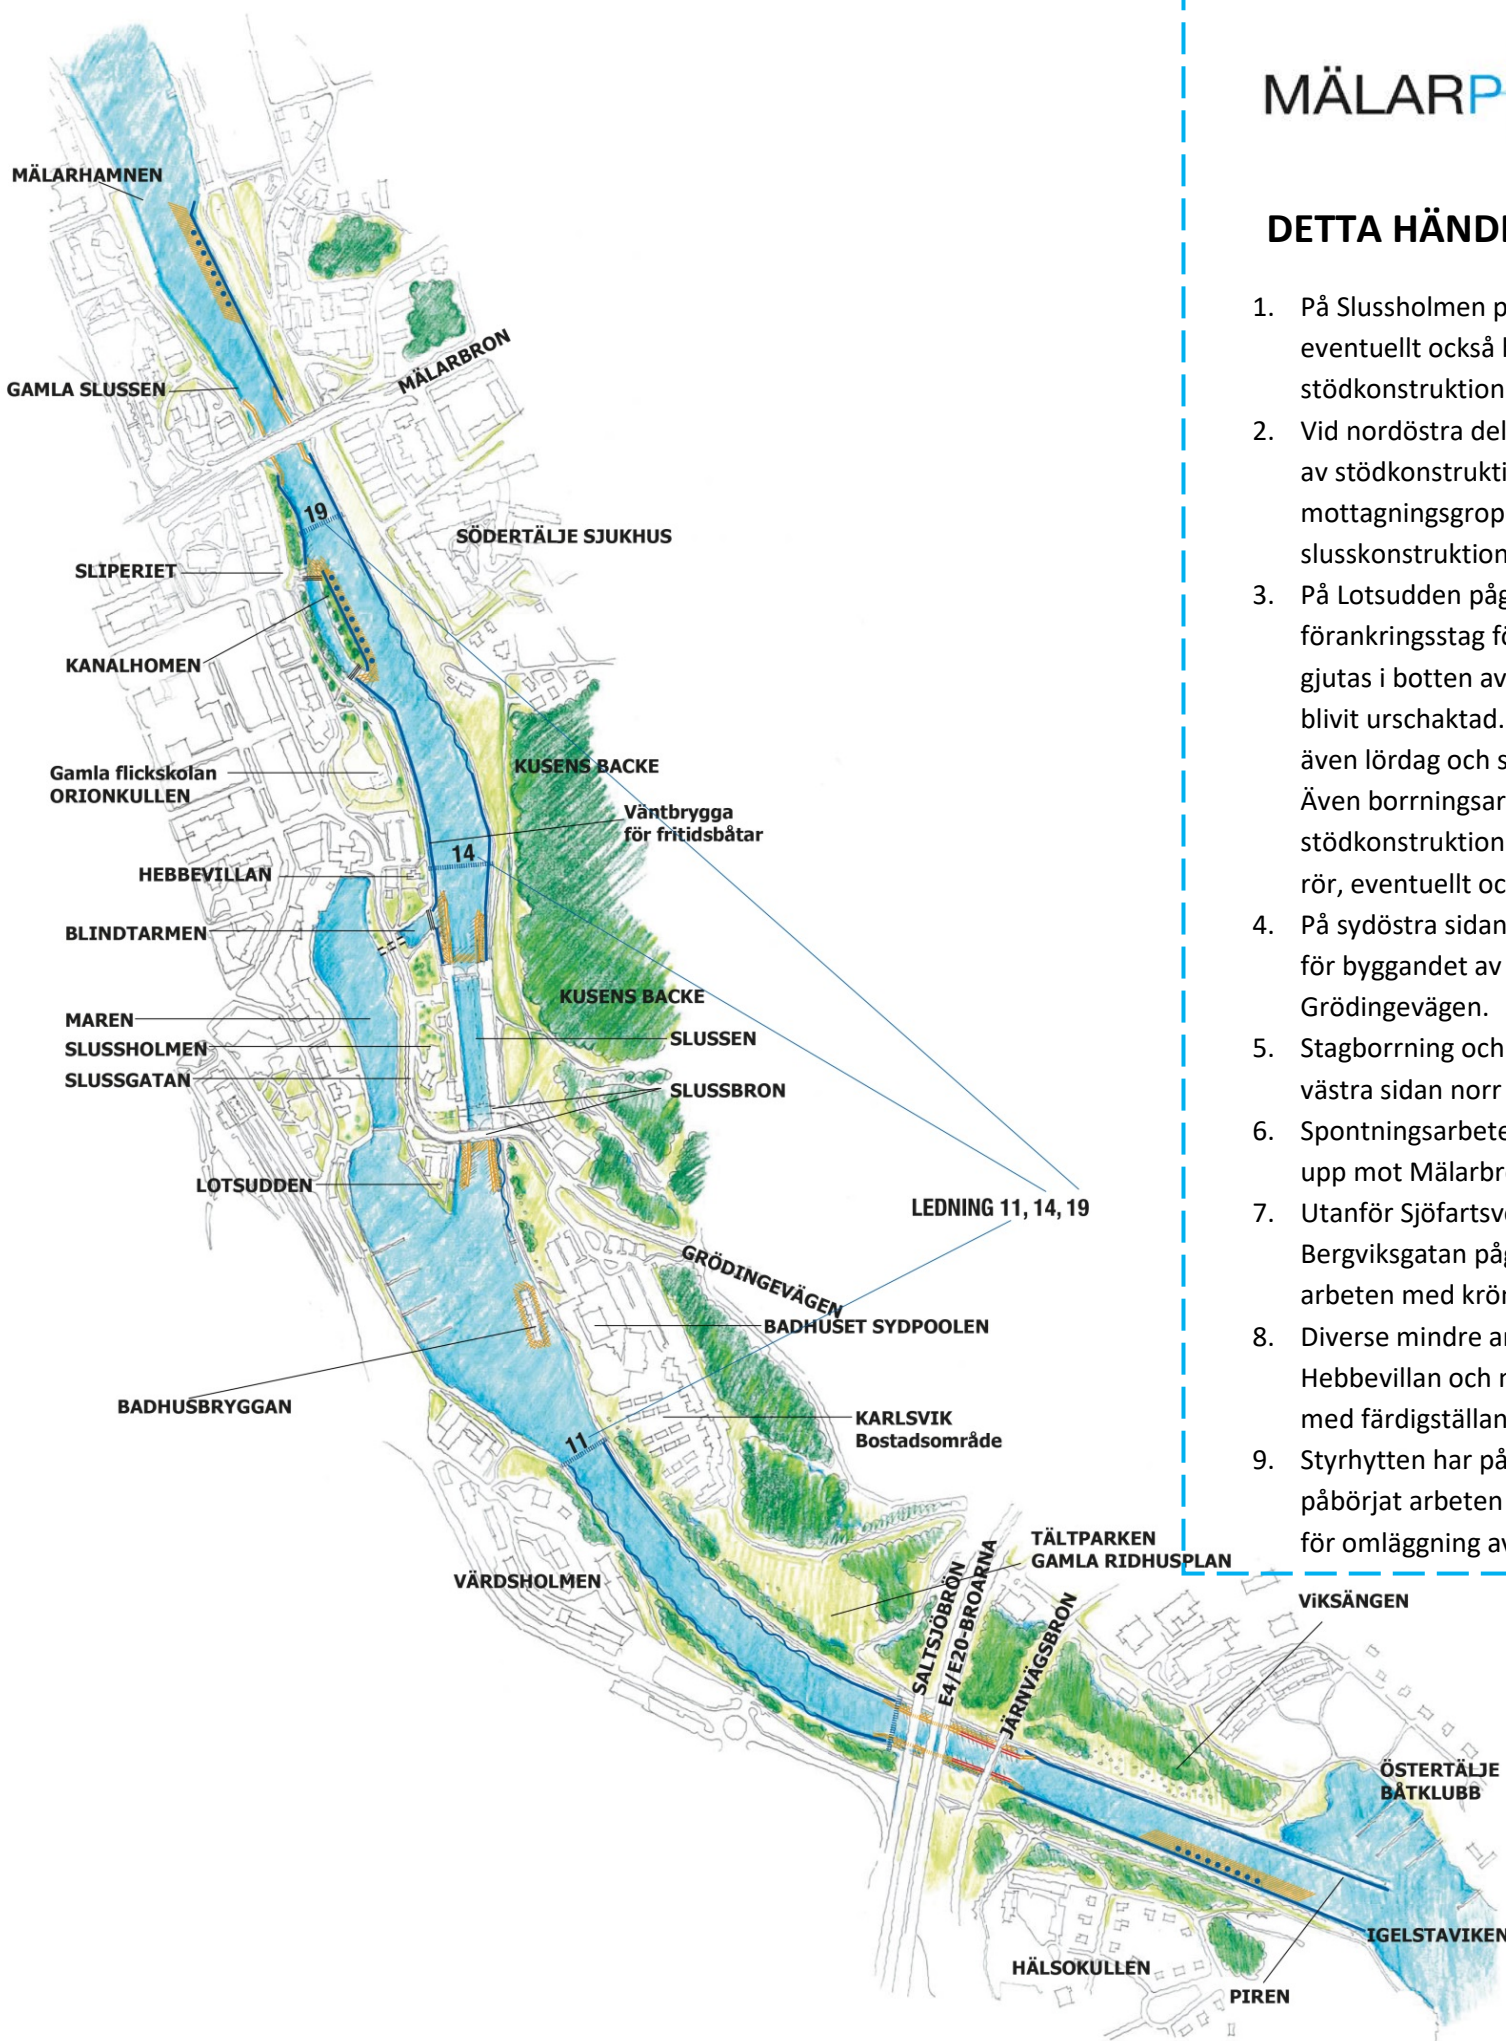

**Mellan kl. 09,00 till kl.19,00, lördag 10 februari och söndag 11 februari kommer borrhingsarbeten att pågå på Lotsudden mittemot vår besöksplattform, se även punkt 3 i faktarutan ovan.**

**Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av: Gunnar Henriksson 076-142 29 57**
