


DETTA HÄNDER VECKA 0919

1. På Slussholmen pågår diverse arbeten och förberedelser för att täta stödkonstruktion inför kommande betonggjutning av bottenkakan.
2. På Lotsudden pågår förberedande arbeten för tätning av stödkonstruktionen i stora gropen.
3. Borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom betongsågning av dykare.
4. Sydöst om slussbron pågår borrningsarbeten för spontsättning för stödvägg i mottagningsgrop.
5. Stagborrning, spontslagning nordvästra kanalen samt smidesarbeten.
6. På Ridhusplan förbereds för formarbeten för krönbalken till kanalsidorna.

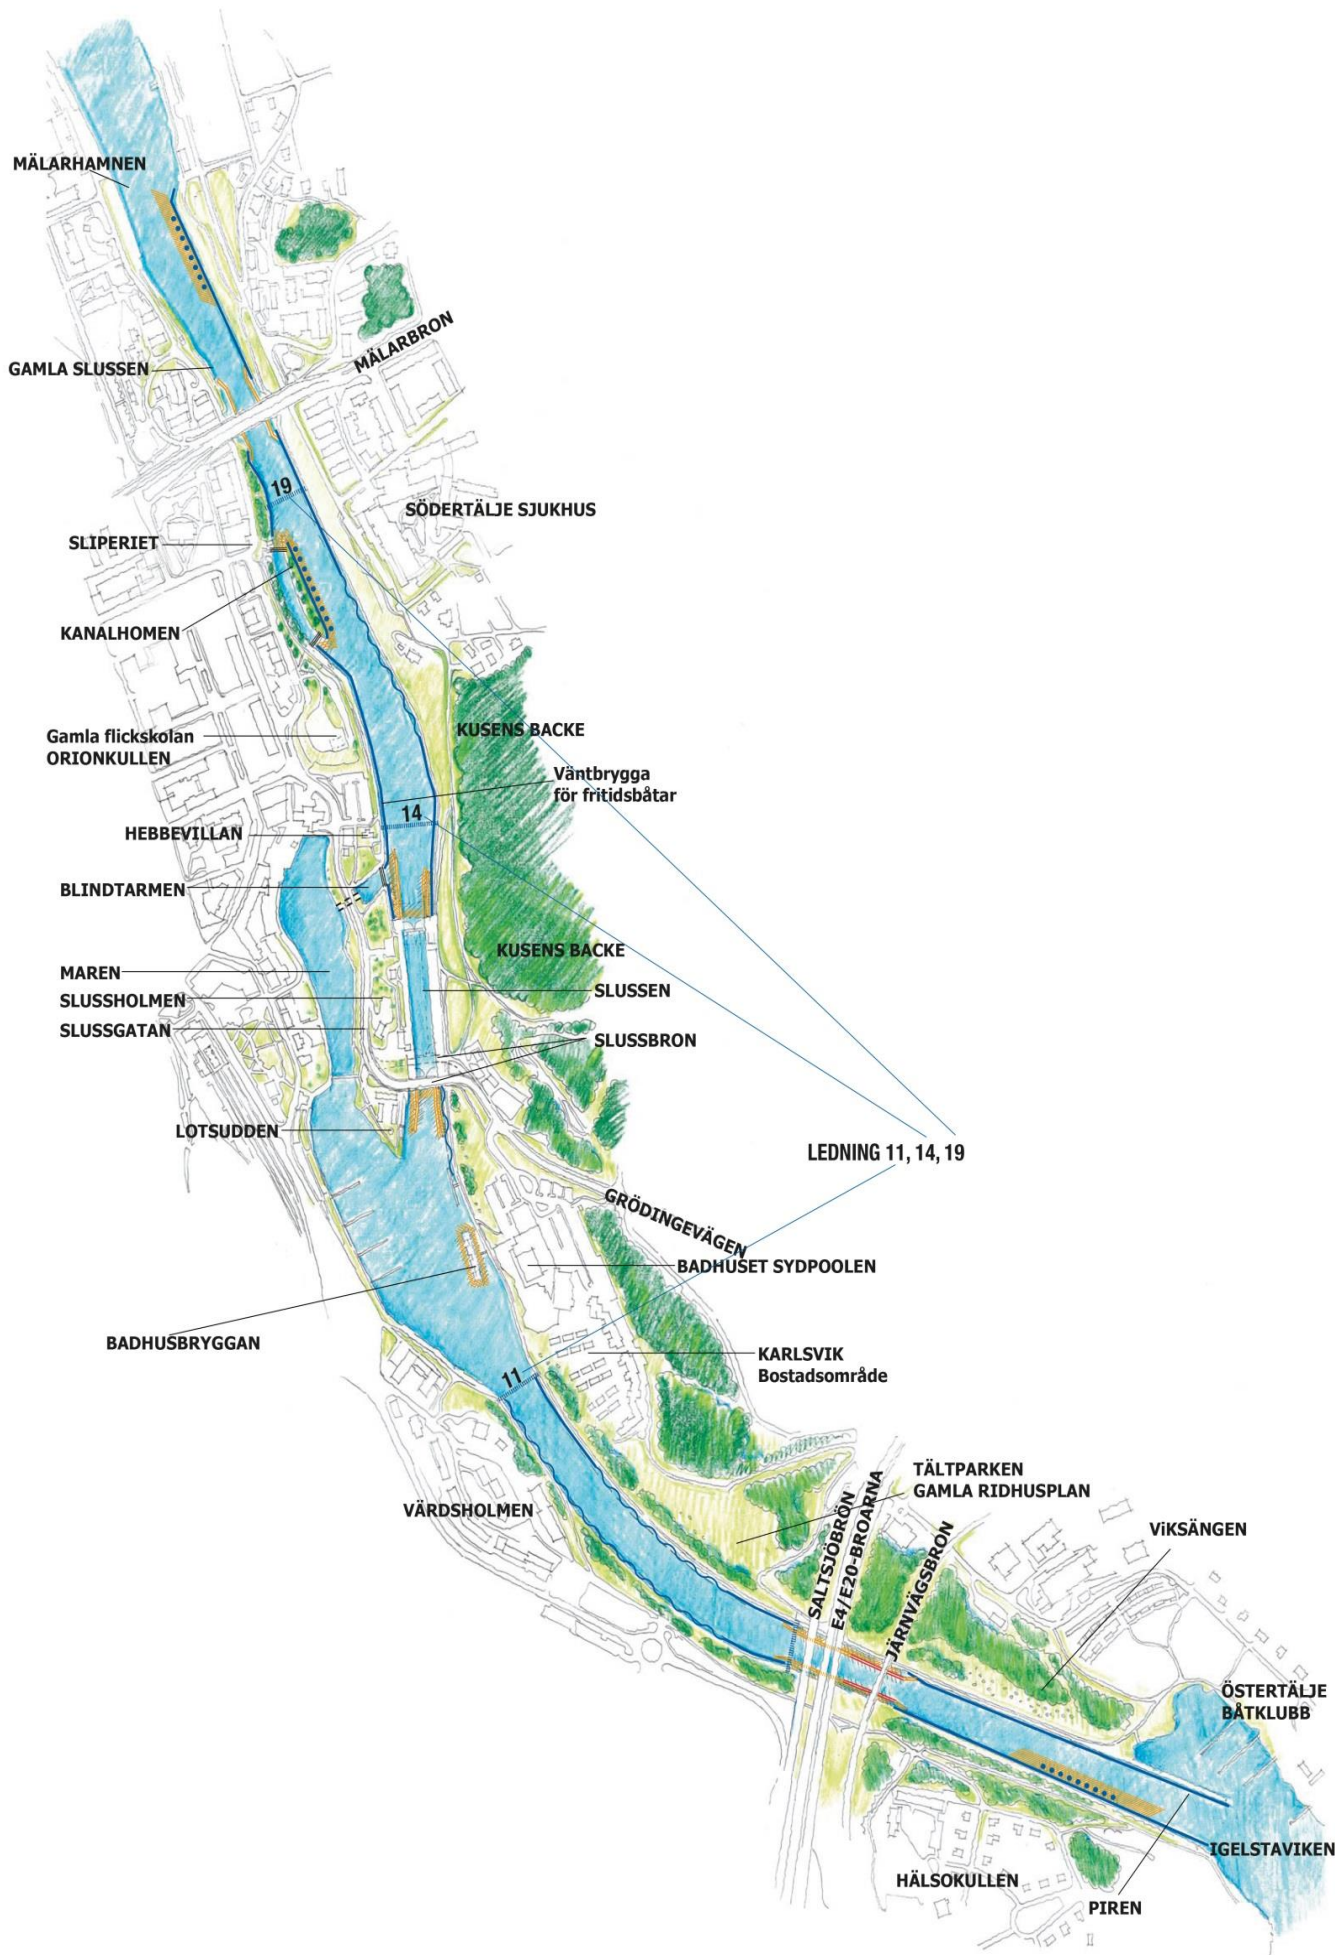

a
