


DETTA HÄNDER VECKA 1719

1. På Slussholmen pågår diverse arbeten och förberedelser inför den kommande betonggjutning av bottenkakan.
2. På Lotsudden pågår förberedande arbeten för tätning av stöd-konstruktionen i stora gropen samt schaktning ur densamma.
3. Stagborring, nordvästra samt nordöstra kanalen vid Kanalholmen samt smidesarbeten.
4. Tredje krönbalksgjutningen har genomförts v. 17 på västra sidan av kanalen norr om E4 bron, formrivning veckan 18.
5. Formarbeten för gjutning av krönbalk i sydvästra kanalen pågår norr om E4-bron.
6. På Ridhusplan pågår formarbeten för krönbalken till kanalsidorna.
7. Förberedelser för installation av ledverk norr om E4-bron.
8. Flytbryggan ska vara på plats nedanför Hebbevillan senast 1a Maj.

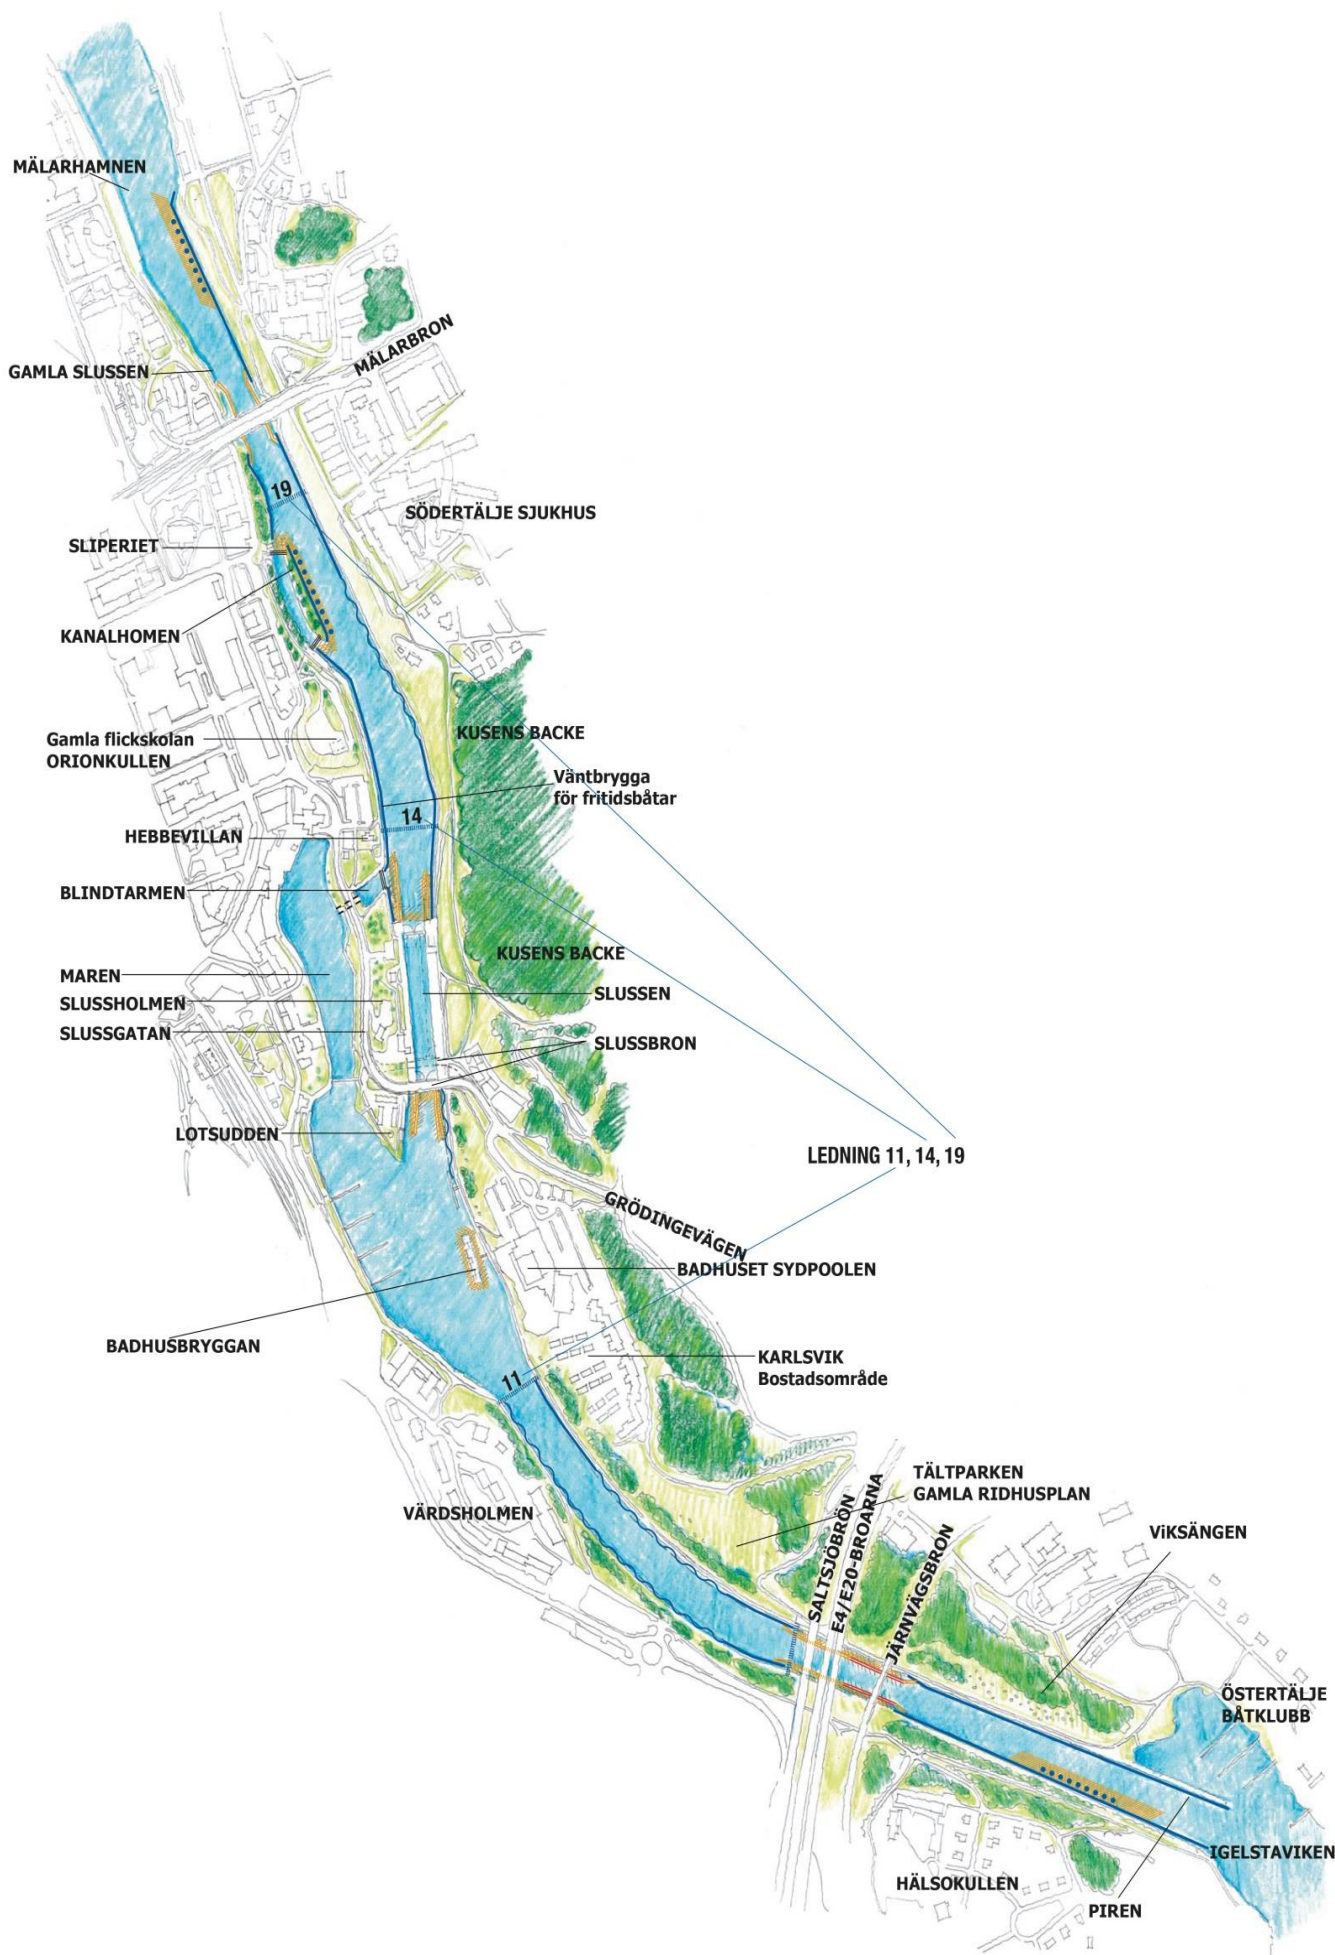

a
