


DETTA HÄNDER VECKA 2918

1. På Slussholmen pågår installation av inclinometer för rörelsekontroll av stödvägg.
2. På Lotsudden pågår staginstallation som ska fungera som förankring av den kommande betong- bottenplattan i gropen. Hammarbanden börjas installeras för att säkra ytterligare stabilitet.
3. Borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom betongsågning och av dykare.
4. Stagborring och smidesarbeten pågår i kanalen.

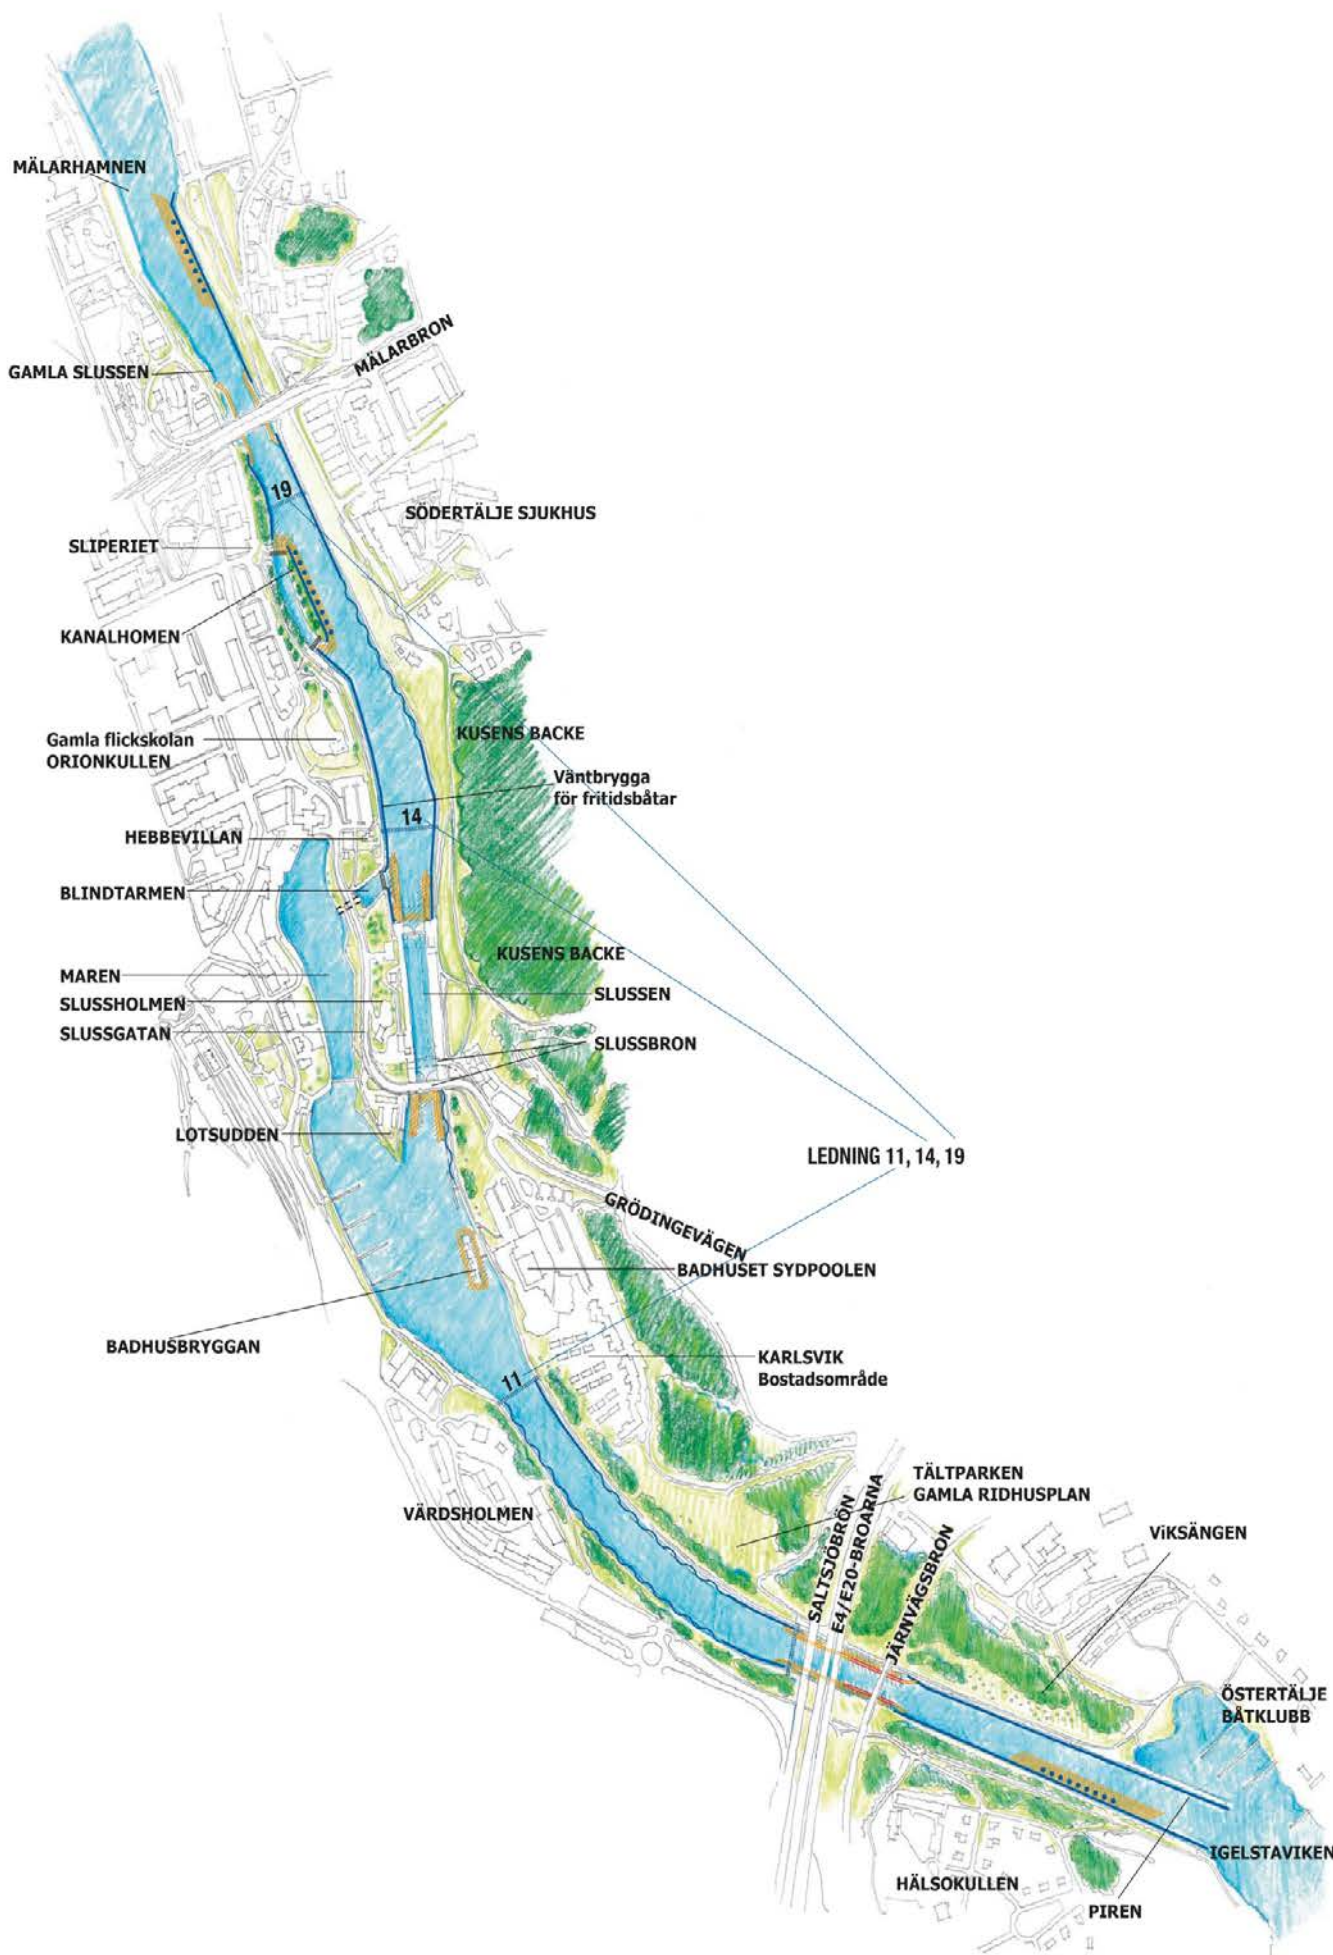

a
