




Spontningsarbetet flyttar norrut

Det senaste halvåret har spontningsarbetet pågått för fullt längs Södertälje kanalens sydvästra sida. Inom kort kommer spontningen längs kanalens västra sida att fortsätta norr om slussen och upp mot Kanalholmen.

Några kortare avsnitt på den sydvästra sidan behöver spontas senare, då de är beroende av att andra jobb åtgärdas innan sponten kan monteras. På kanalens östra sida kan spontningsarbetet komma igång först när den avloppsledning (ledning 11, se kartan på nästa sida), som går under kanalen och vidare söderut i gång- och cykelbanan är omlagd och säkrad så att den inte riskerar att gå sönder av spontarbetet. Arbetet med avloppsledningen kommer att utföras av Tälje Nät och beräknas börja i december 2017 och förväntas pågå till och med hösten 2018. Först efter det ledningsarbetet är utfört kommer även kanalens östra sida att spontas.

Medan spontarbetet övergår till sträckan norr om Södertälje sluss fortsätter arbetet i sydvästra kanalen med att förankra den monterade sponten med dubb och stag. När stagen, som håller sponten på plats, är monterad gjuts en betongbalk, en så kallad krönbalk på spontens topp. Krönbalken fungerar bland annat som ett rostskydd till stålsponten.

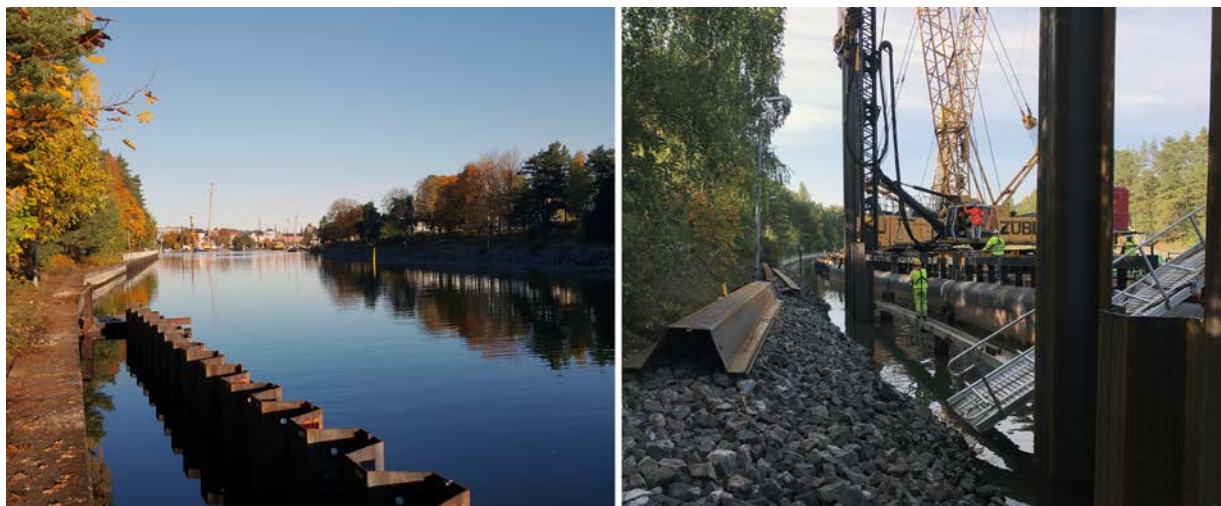


Mälarpjektet

Syftet med Mälarpjektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Läs mer om projektet på www.sjofartsverket.se/malarprojektet

Detta händer just nu:

1. På Lotsudden och Slussholmen pågår borrningsarbeten i linje för stödkonstruktion samt vibrering av rör och spont, eventuellt också hammarslagning.
2. På östra sidan mitt emot slussbassängen mot Kusens Backe pågår svetsarbeten.
3. Dubb- och stagborrning av spont pågår sydväst om Järnvägsbron.
4. Spontningsarbeten inklusive stagborrning norr om Saltsjöbron på västra sidan upp emot småbåtshamnen.
5. Arbeten vid Hebbevillan samt i kanalen utanför med skyddstäckning av Skanovas ledning.
6. Förberedande schaktarbeten i nordöstra mottagningsgropen vid slussen.
7. Utmed Bergviksgatan pågår etablering för kommande arbeten med krönbalksarbeten i kanalen.

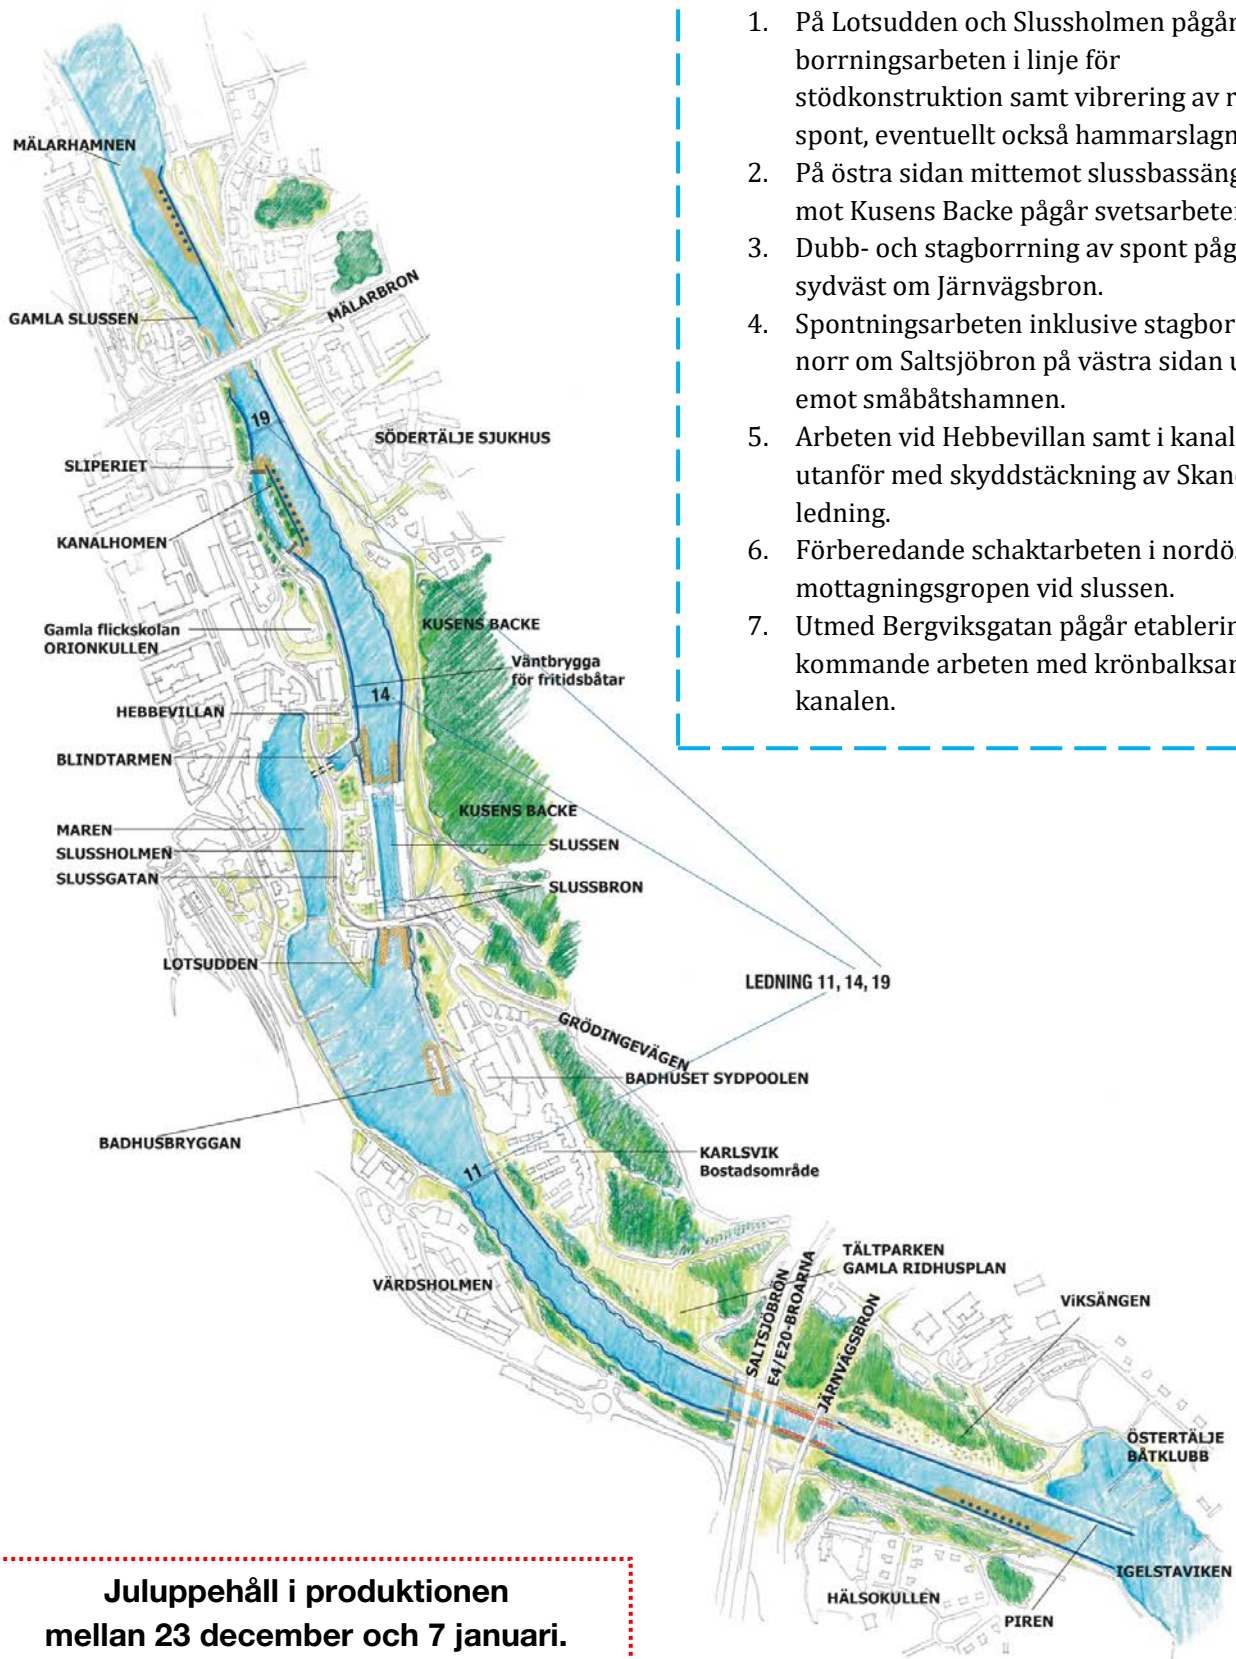

Juluppehåll i produktionen
mellan 23 december och 7 januari.
