


DETTA HÄNDER VECKA 2018

1. På Slussholmen pågår borrning för förankringsstag för den betongplatta som ska gutas i botten av den stora gropen när den har blivit urschaktad. Jetgroutingarbeten pågår för att täta håligheter i stödväggen.
2. På Lotsudden pågår rörborrning för att färdigställa stödväggen ut mot kanalen.
3. På sydöstra sidan om slussbron pågår förskaktningsarbeten för byggandet av en stödkonstruktion mot Grödingevägen samt installation av 800 mm:s rör. Här kommer en mottagningsgrop för den nya sluss-konstruktionen att byggas samt det nya brofundamentet. Bortbilning av gammal betongplatta från 1922.
4. Förberedelsearbeten för borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom sågning av dykare.
5. Stagborrning och smidesarbeten pågår på västra sidan norr och söder om Saltsjöbron.
6. Slutförande av spontningsarbeten sker utanför Hebbevillan och ned mot Blindtarmen.
7. Rivning av dykdalber pågår sydost om E4/E20 broarna.

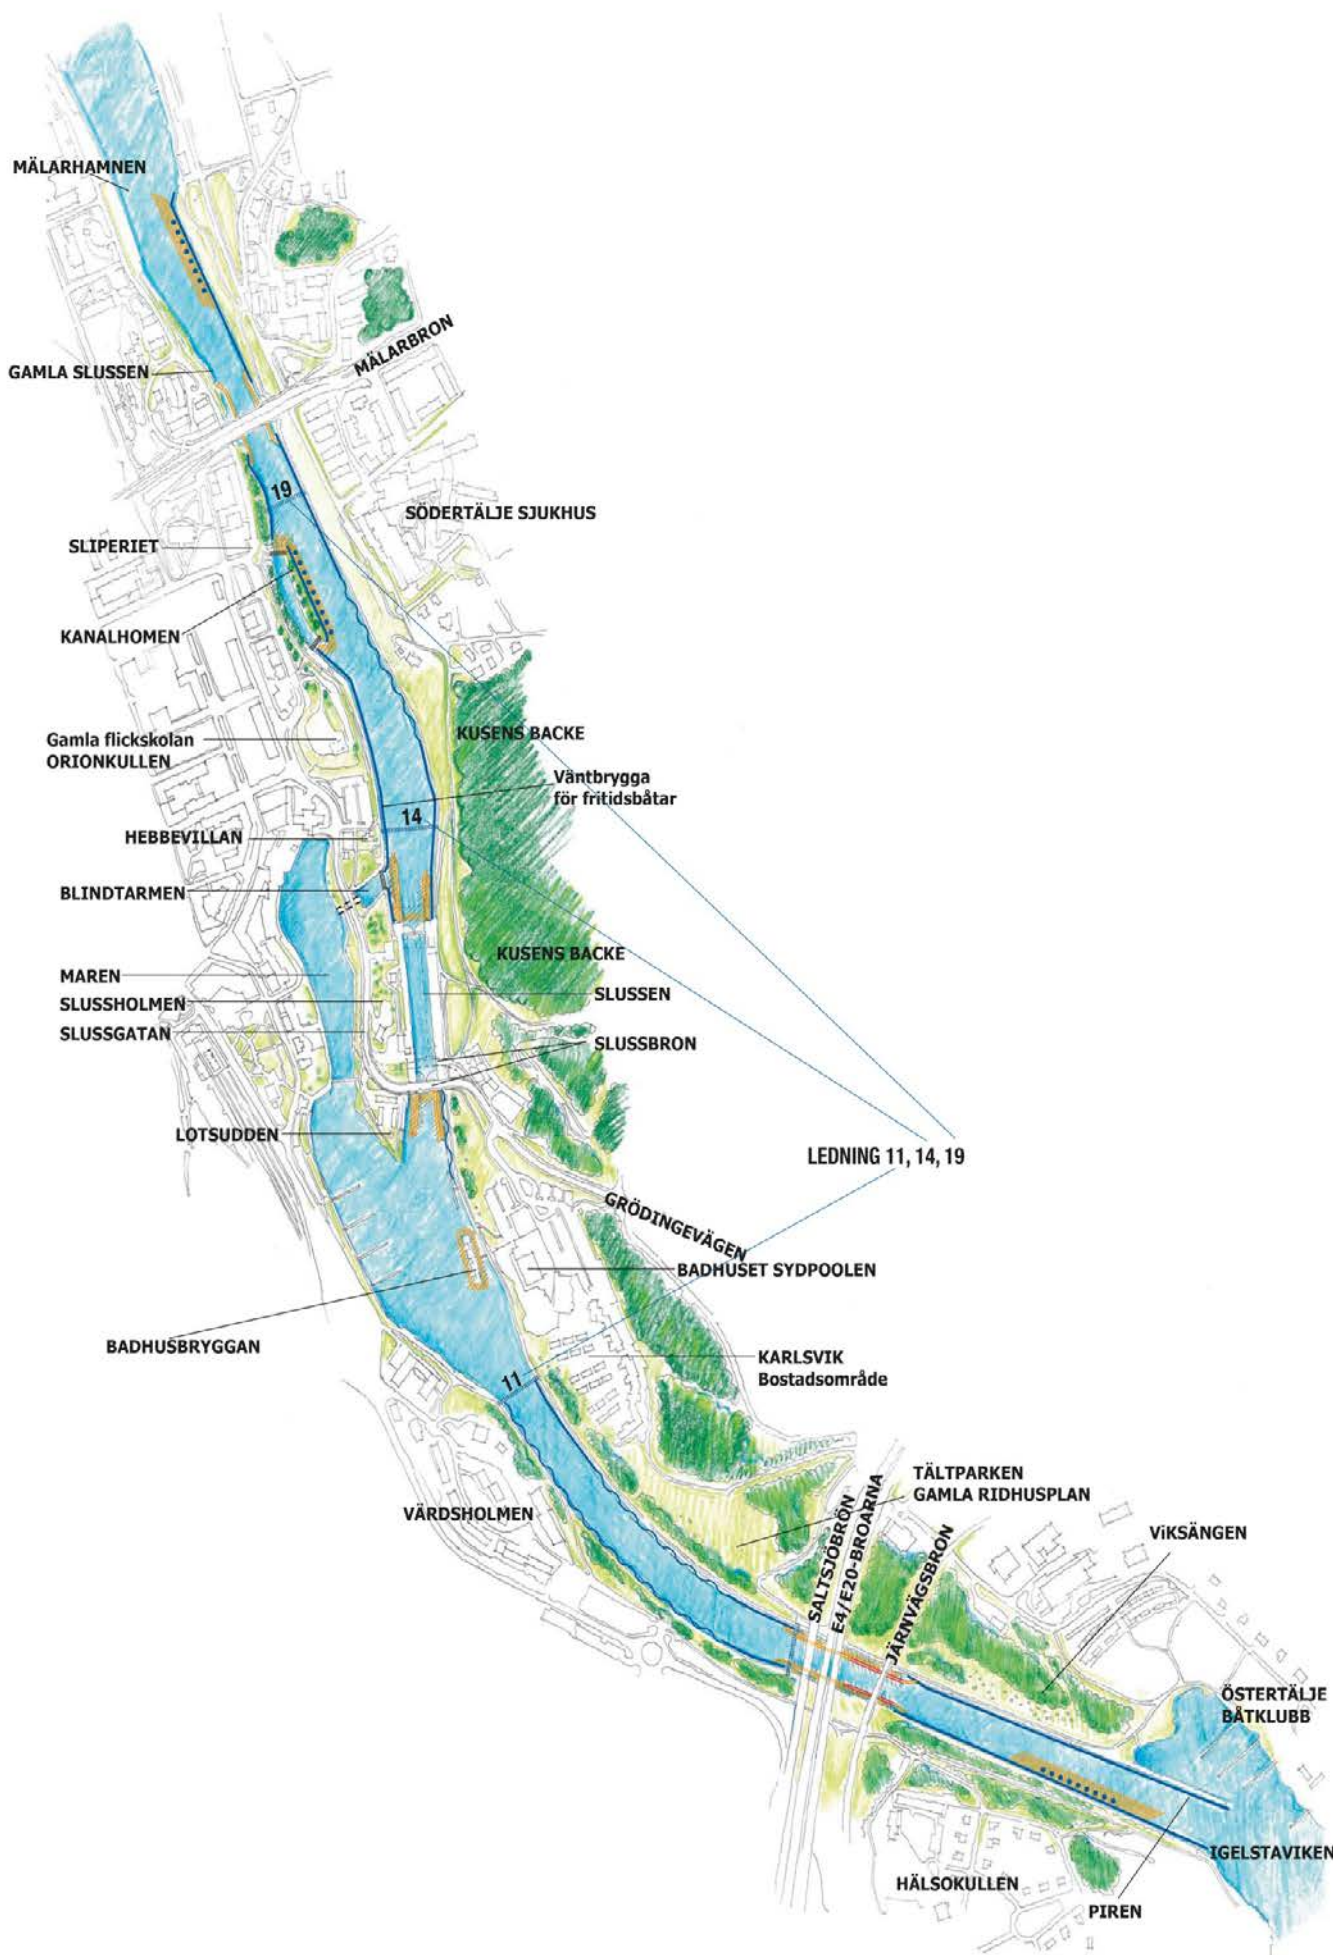

a

Mellan kl. 09,00 till kl.19,00, lördag 19 maj och söndag 20 maj kommer borrhingsarbeten att pågå på Slussholmen, se även punkt 1 i faktarutan ovan.

Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av: Bendix Gadegaad 072-222 83 12
