


DETTA HÄNDER VECKA 2318

1. Jetgroutingarbeten pågår för att tätta håligheter i stödväggen.
2. På Lotsudden pågår rörborrning för att färdigställa stödväggen ut mot kanalen.
3. På nordöstra sidan om slussen pågår installation av 800 mm:s rör. Här kommer en mottagningsgrop för den nya slusskonstruktionen att byggas.
4. Förberedelsearbeten för borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom betongsågning och sprängning av dykare.
5. Stagborrning och smidesarbeten pågår på västra sidan norr och söder om Saltsjöbron.
6. Spontningen sker på östra sidan upp mot Mälarbron.

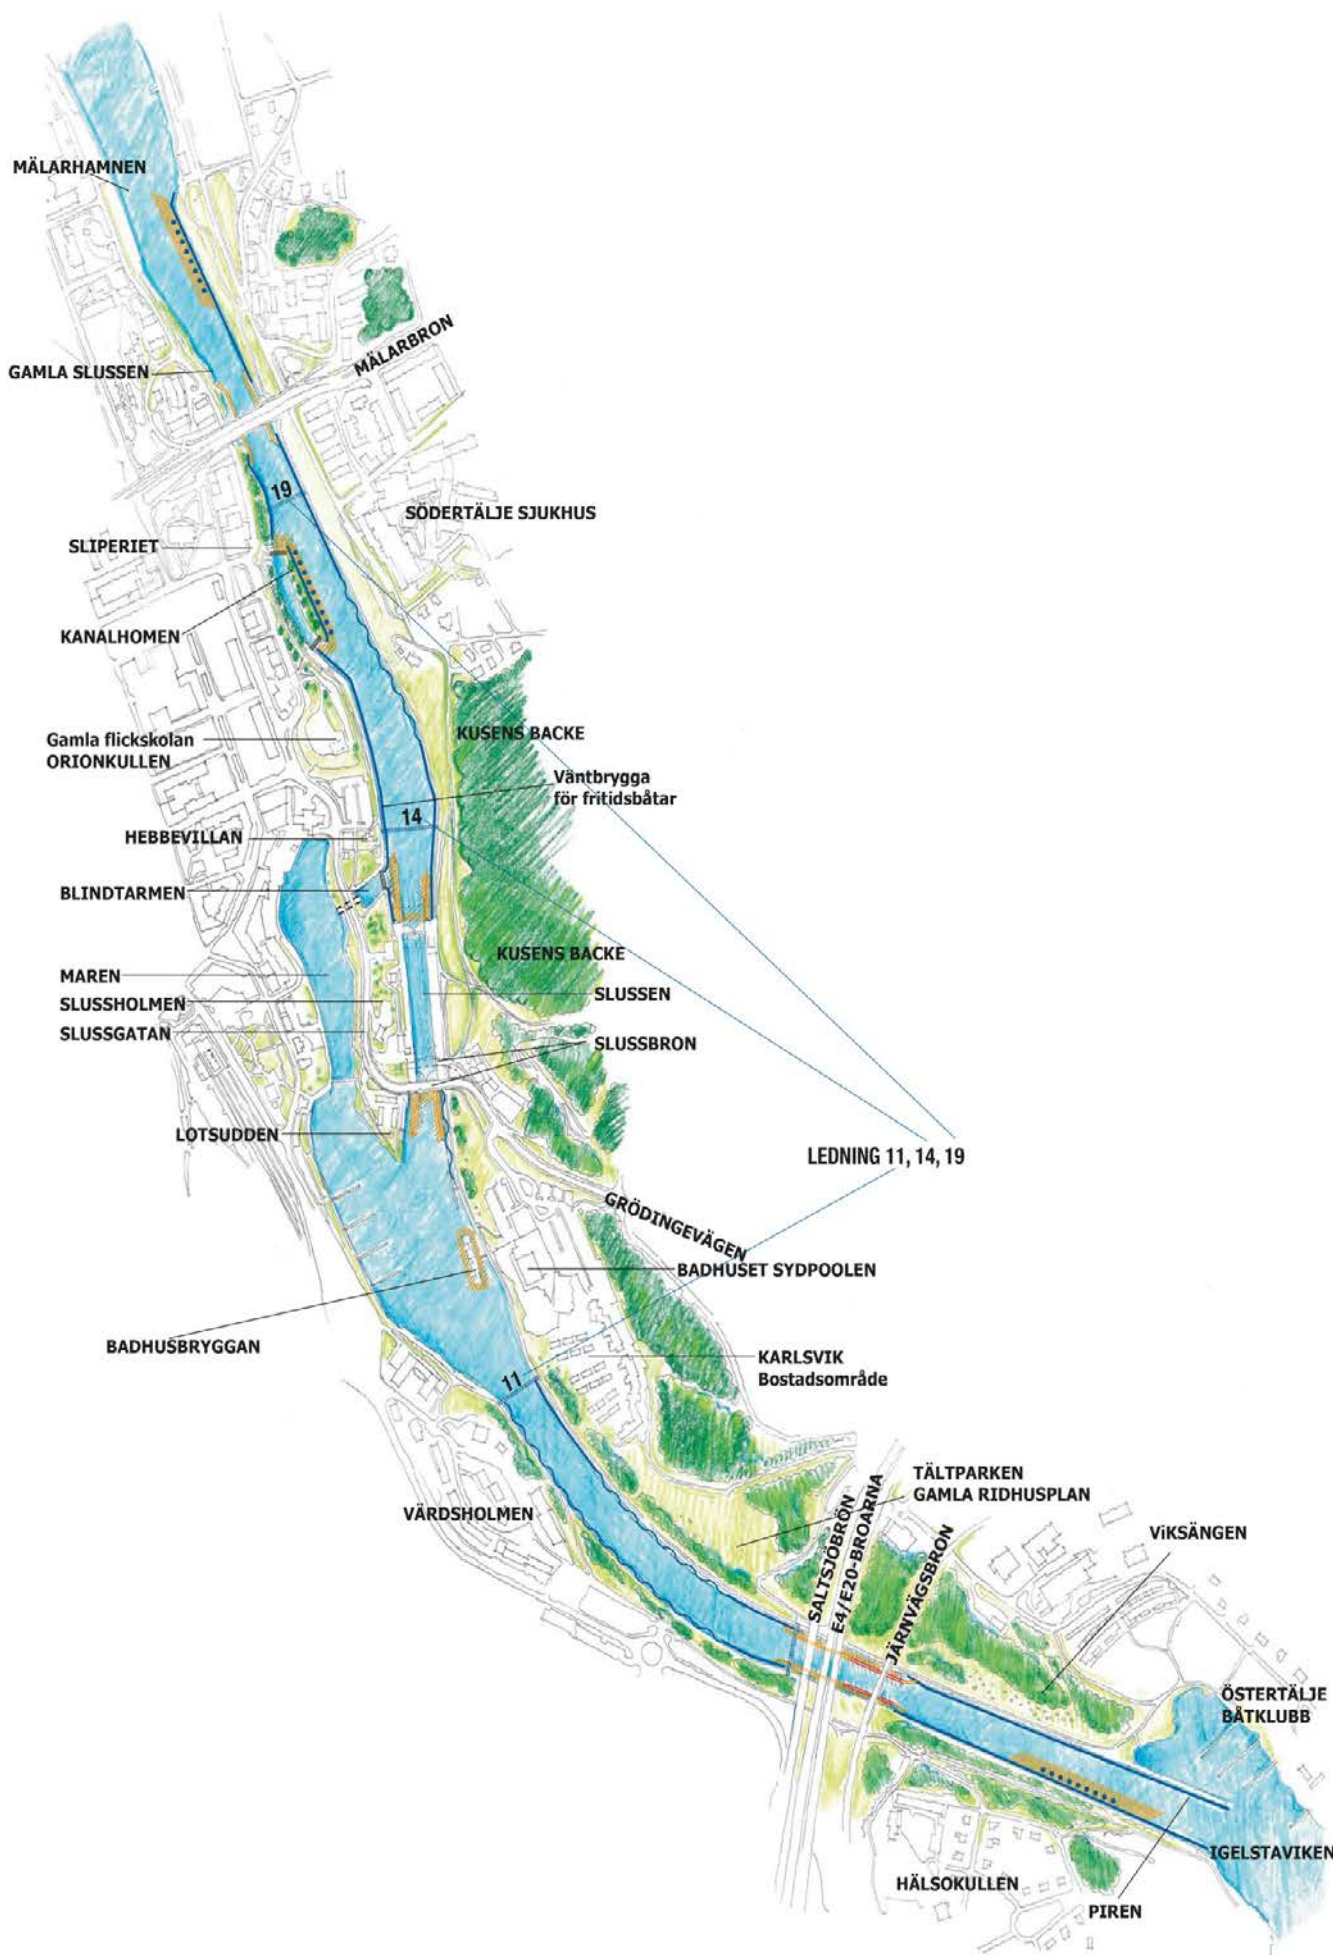

a

Mellan kl. 09,00 till kl.19,00, lördag 2 juni och söndag 3 juni kommer borrhingsarbeten att pågå på Slussholmen, se även punkt 1 i faktarutan ovan.

Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av: Bendix Gadegaad 072-222 83 12
