


DETTA HÄNDER VECKA 2418

1. Kontrollborrning av jetgrouting.
2. På Lotsudden pågår rörborrning för att färdigställa stödväggen ut mot kanalen.
3. På sydöstra sidan av slussen påbörjas installation av 800 mm:s rör för den kommande mottagningsgropen av slusskonstruktionen.
4. Borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom betongsågning och sprängning av dykare.
5. Stagborrning och smidesarbeten pågår på västra sidan norr och söder om Saltsjöbron.
6. Spontningen sker på östra sidan norr om Mälarbron.

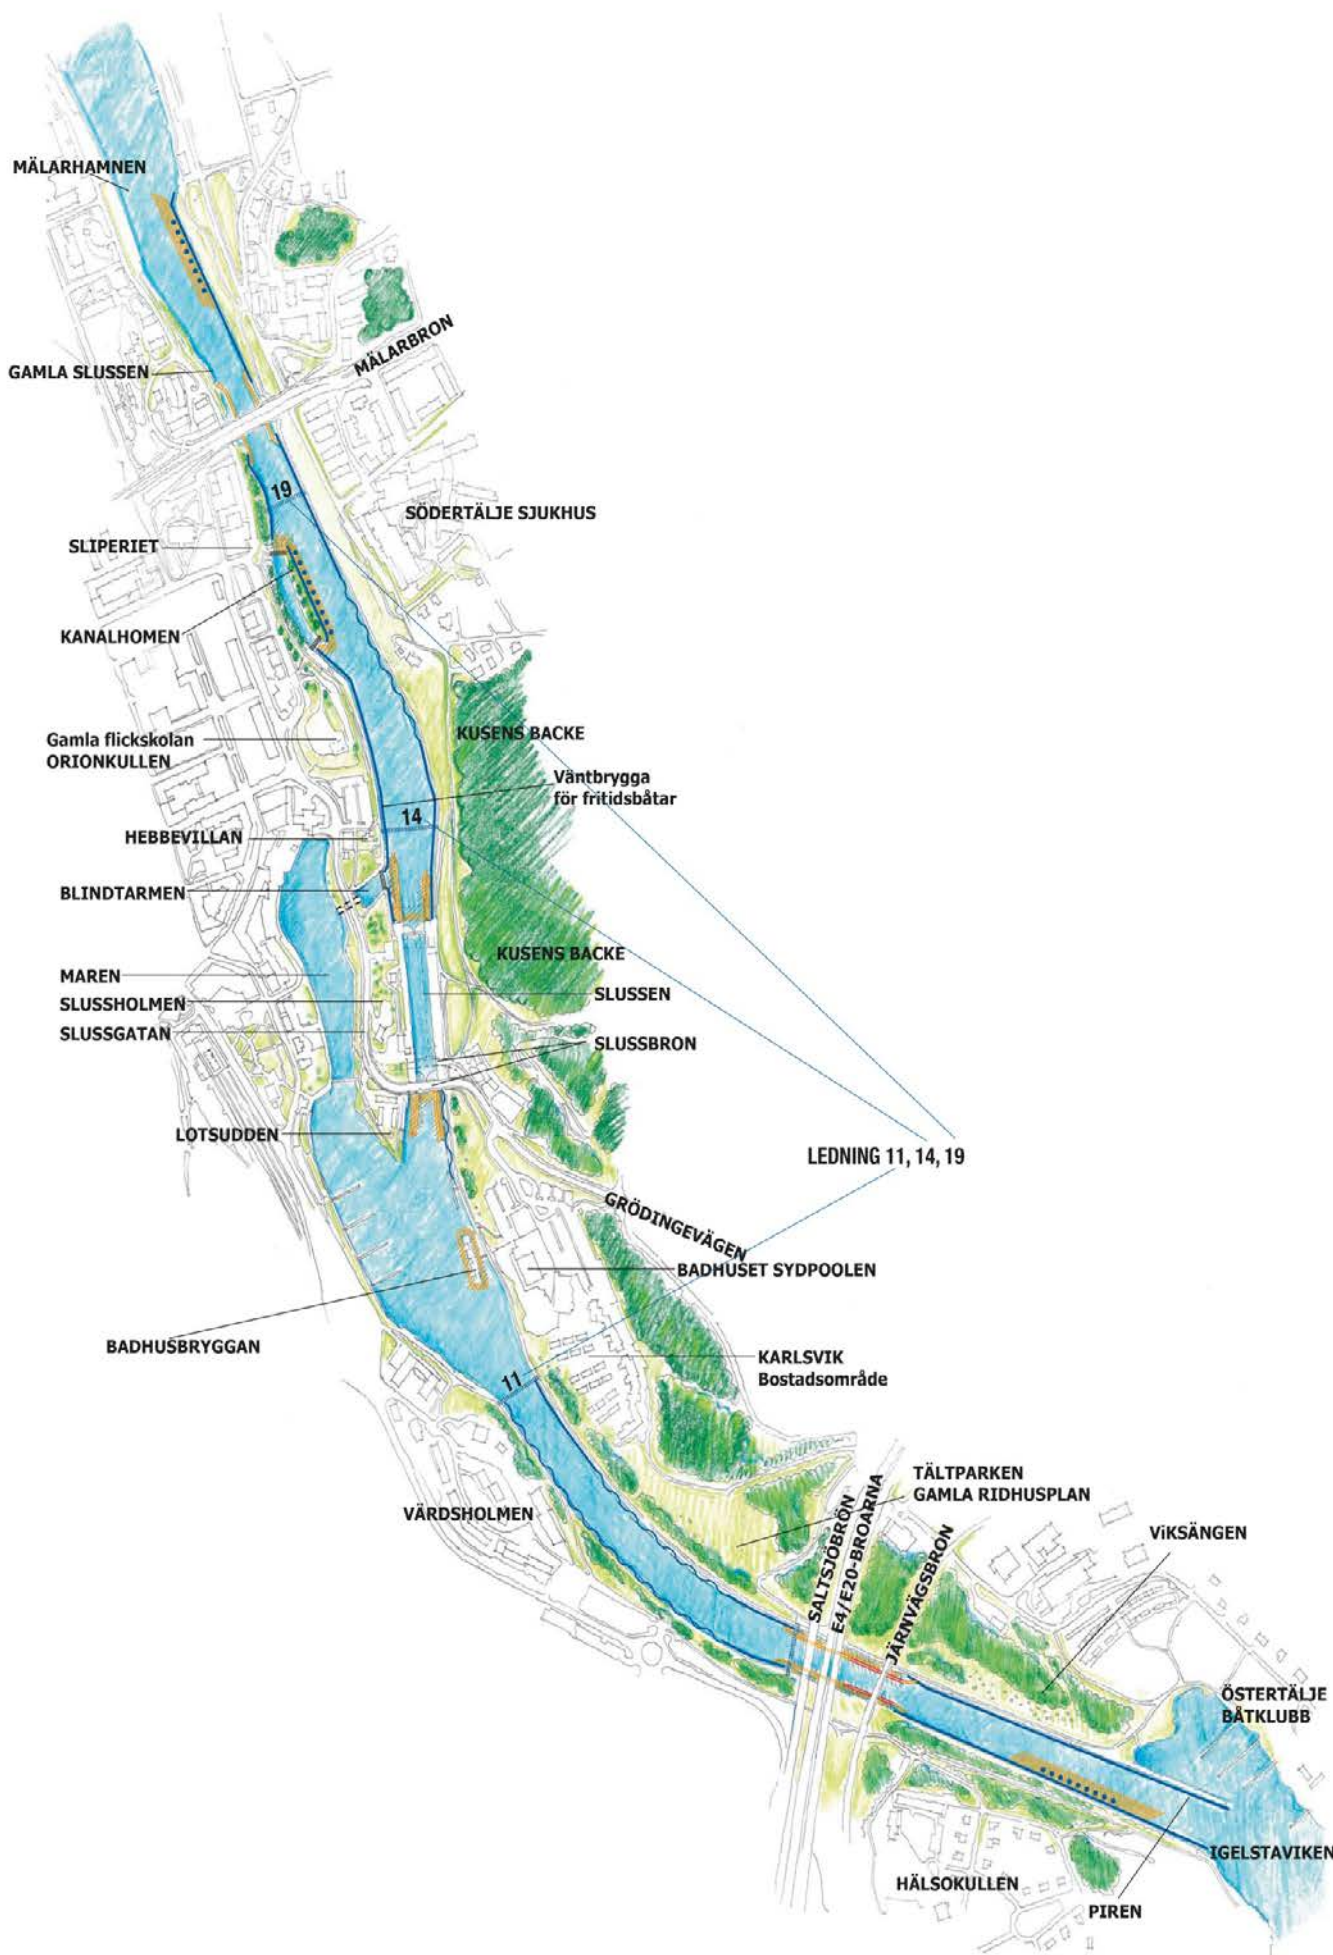

a

Mellan kl. 09,00 till kl.19,00, lördag 2 juni och söndag 3 juni kommer borrhingsarbeten att pågå på Slussholmen, se även punkt 1 i faktarutan ovan.

Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av: Bendix Gadegaad 072-222 83 12
