


DETTA HÄNDER VECKA 142018

1. På Slussholmen pågår borring för förankringsstag för den betongplatta som ska gutas i botten av den stora gropen när den har blivit urschaktad. Förboring sker också inför kommande jetgroutingarbeten.
2. I läget för den norra mottagningsgropen på östra sidan kommer installation av 800 mm rör att ske med vibrering och hammarslagning.
3. På sydöstra sidan om slussbron pågår förskaktningsarbeten för byggandet av en stödkonstruktion mot Grödingevägen. Här kommer en mottagningsgrop för den nya slusskonstruktionen att byggas samt det nya brofundamentet.
4. Förberedelsearbete med borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom sågning av dykare.
5. Stagborring och smidesarbeten pågår på västra sidan norr och söder om Saltsjöbron.
6. Spontningsarbeten pågår på östra sidan, norr om slussen och förflyttar sig mot Mälarbron.
7. Utanför Sjöfartsverkets "prickförråd" utmed Bergviksgatan pågår etablering för kommande arbeten med krönbalksarbeten i kanalen.
8. Uppe på Ridhusplan pågår etablering för upplagsytor för material.
9. Rivning av dykdalber pågår sydost om E4/E20 broarna.

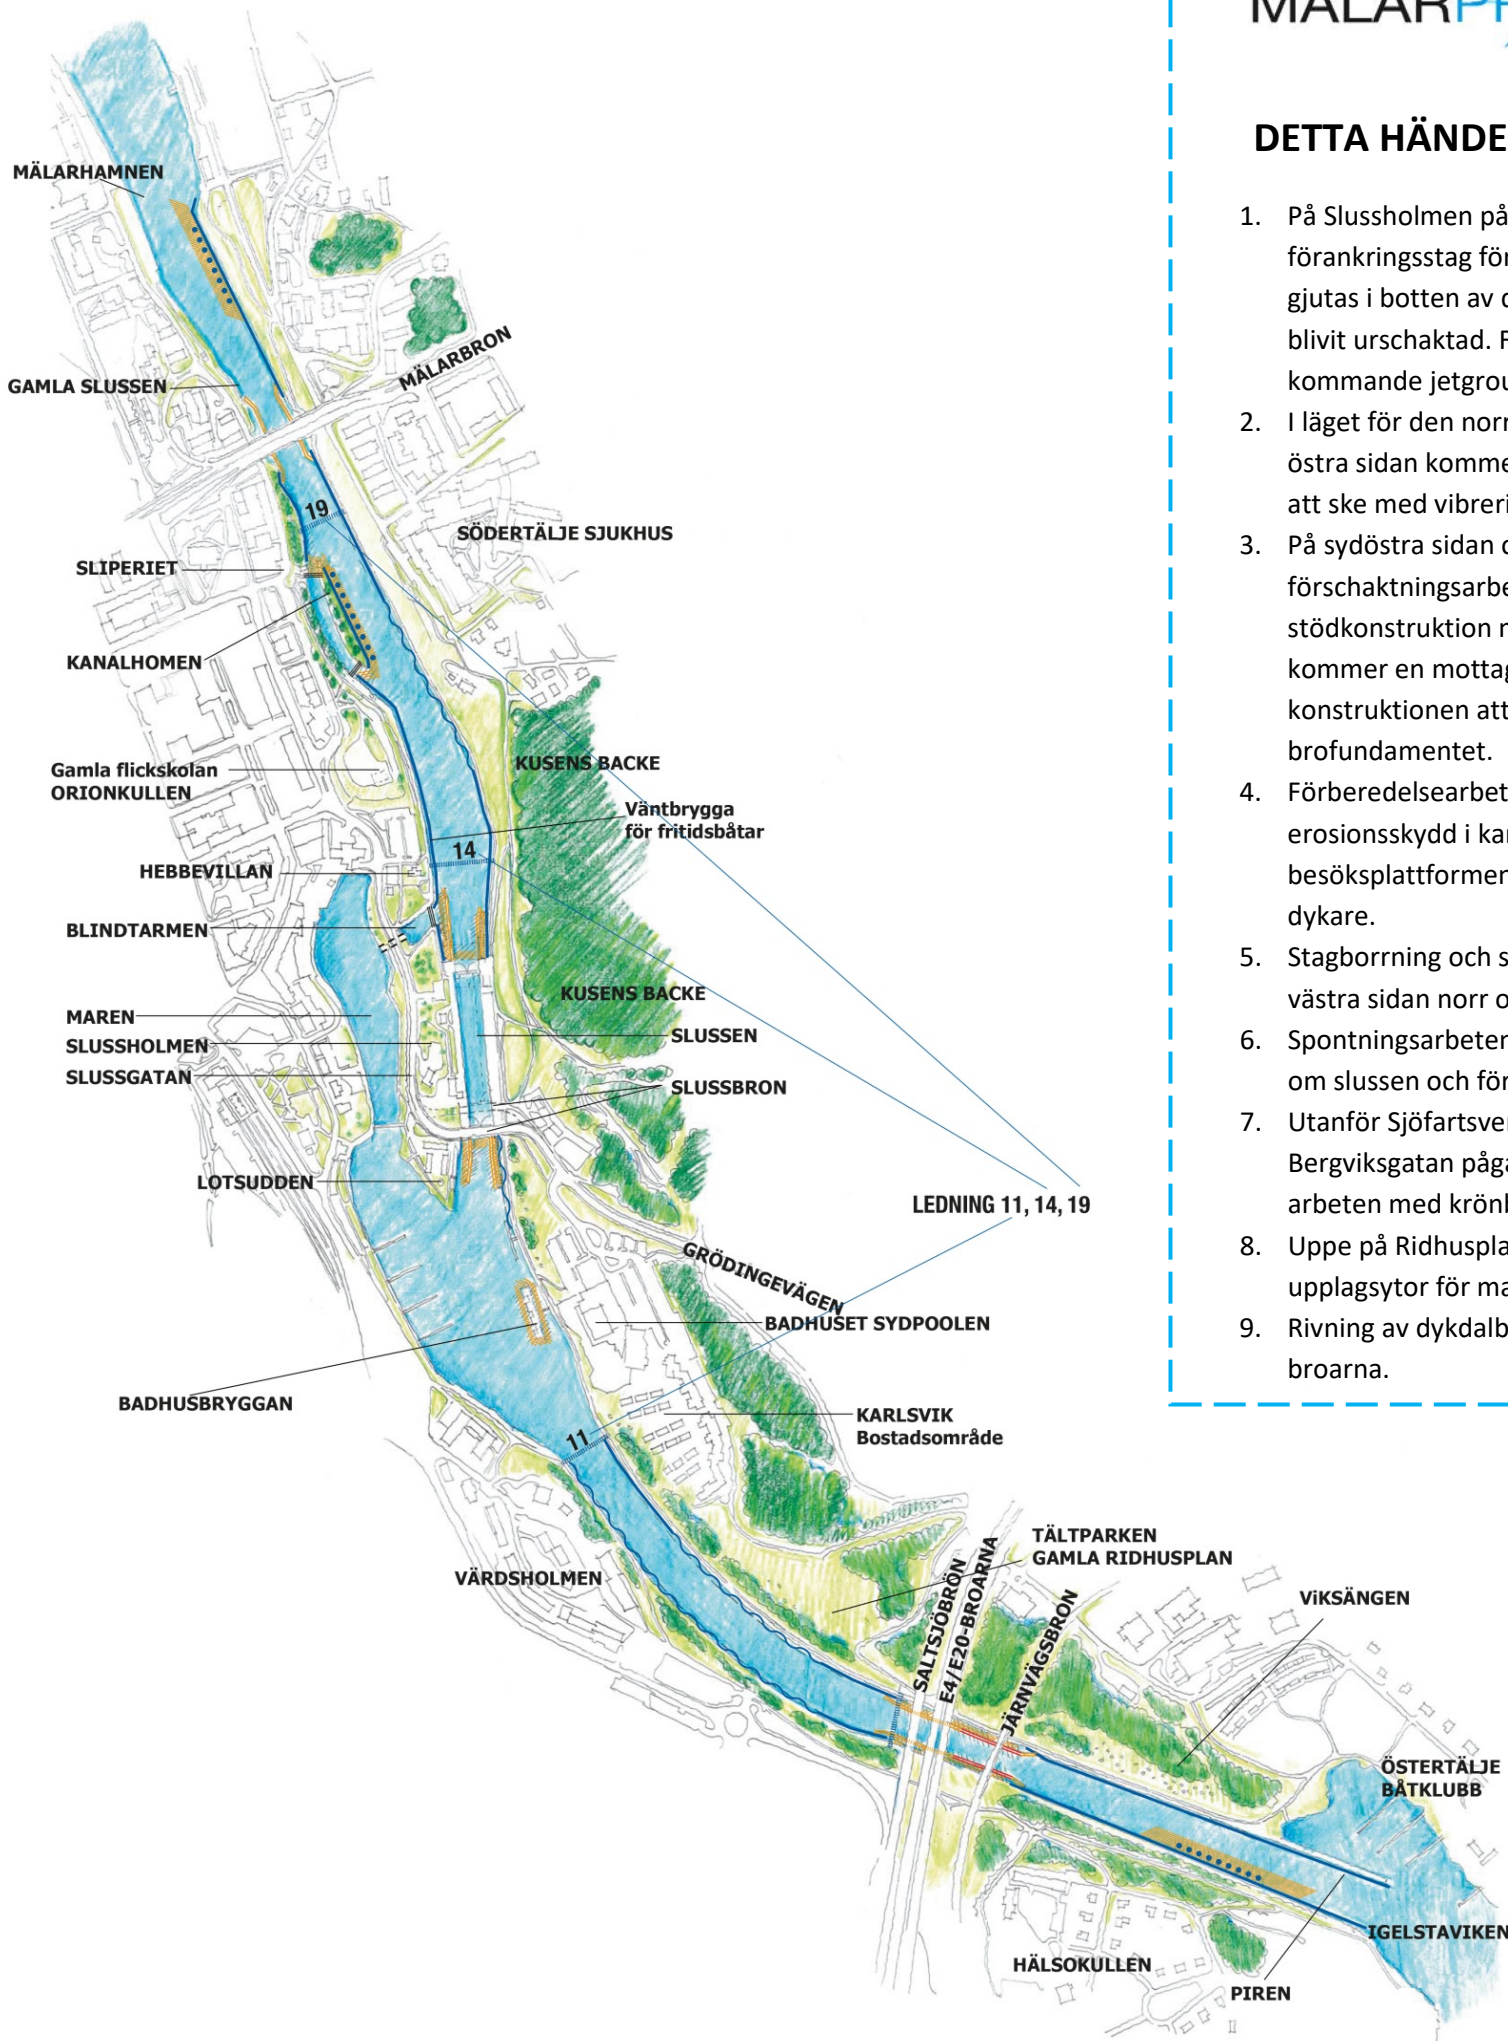

a

Inga arbeten kommer att pågå under påskhelgen på Slussholmen, se även punkt 1 i faktarutan ovan.

Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av: Hans Sundström 070-297 78 19
