


DETTA HÄNDER VECKA 172018

1. På Slussholmen pågår borrhning för förankringsstag för den betongplatta som ska gutas i botten av den stora gropen när den har blivit urschaktad. Jetgroutingarbeten pågår för att täta håligheter i stödväggen.
2. På Lotsudden påbörjas rörborrhning för att färdigställa stödväggen ut mot kanalen.
3. På sydöstra sidan om slussbron pågår förskaktningsarbeten för byggandet av en stödkonstruktion mot Grödingevägen. Här kommer en mottagningsgrop för den nya sluss-konstruktionen att byggas samt det nya brofundamentet. Bortbilning av gammal betongplatta från 1922.
4. Förberedelsearbete m för borttagning av erosionskydd i kanalen nedanför besöksplattformen pågår genom sågning av dykare.
5. Mindre arbeten utförs vid ledning 14 mitt emot Hebbevillan.
6. Stagborrhning och smidesarbeten pågår på västra sidan norr och söder om Saltsjöbron.
7. Spontningsarbeten pågår på östra sidan, norr om slussen och förflyttar sig mot Mälarbron.
8. Utanför Sjöfartsverkets "prickförråd" utmed Bergviksgatan pågår etablering för kommande arbeten med krönbalksarbeten i kanalen.
9. Rivning av dykdalber pågår sydost om E4/E20 broarna.

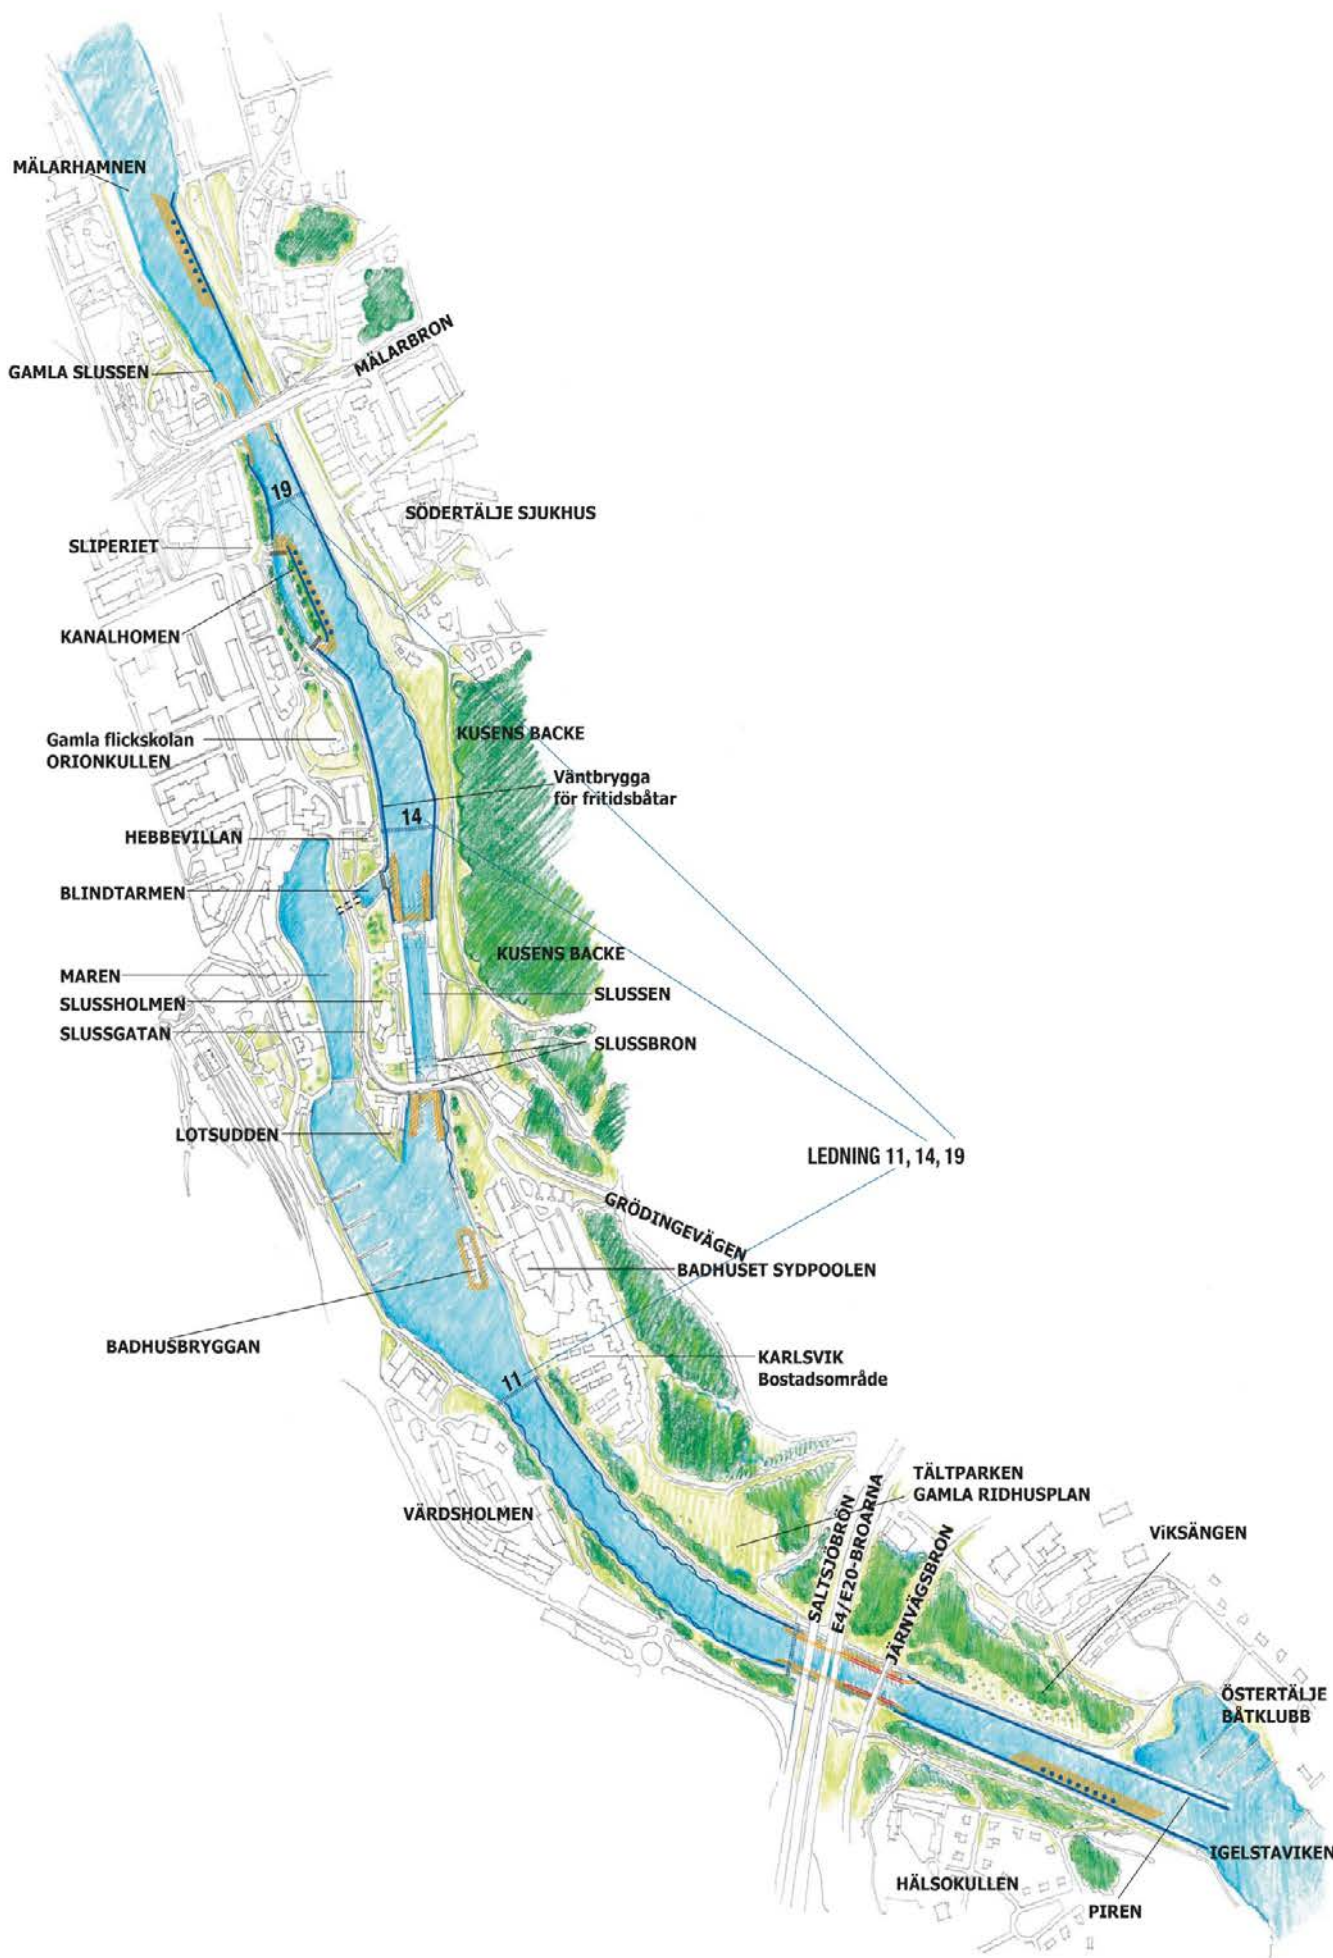

a

Mellan kl. 09,00 till kl.19,00, lördag 21 april och söndag 22 april kommer borrhningsarbeten att pågå på Slussholmen, se även punkt 1 i faktarutan ovan.

Eventuella frågor och synpunkter kring dessa arbeten besvaras av: Hans Sundström 070-297 78 19
